



VINÇOTTE vzw

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW: BE 0402 726 875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

- ☒ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
☐ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
☐ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 221 86 11
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be

Verslag nr.:

30667665



N 149362

Resi code:

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie:

Eigenaar of beheerder:

Naam, voornaam:	Naam, voornaam: <u>Wouter</u>
Ident. Kaart nr.:	Adres: <u>Ban Hensstraat 21</u>
BTW nr.: BE	Post nr. + Stad: <u>2031 Vervaeke</u>
	Tel: / /

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

☒ Art 270	☐ ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271 bis	☒ Wooneenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☒ Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 276	☐ periodiek	☐ controle		☐ Art 88	☐ Art	☒ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276	☐ verzwaaring	☐ Art 276bis	verkoop van een wooneenheid	☐ Art	☐ Art	☒ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler	EAN:	☒ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: meterstand dag: meterstand nacht:	☐ kWh excl. nacht meter:	nr.: meterstand:
Gegevens installatie	Bescherming aansluiting (A): ☐ 020 ☐ 025 ☒ 032 ☐ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100	Ontworpen voor U _N : ☒ 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V	Type aardelektrode: ☐ aardingslus ☐ pen / baar
	Maximale nominale stroom (A): ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☐ 040 ☐ 050 ☒ 063 ☐ 080 ☐ 100	Voedingsleiding hoofdbord: X mm ² - Type:	☒ 220V 2-pool
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting: <u>63</u> A / <u>30</u> mA	Aantal borden: <u>1</u>	Aantal eindstroombanen: <u>1</u>
☐ zie bijlage(n)	<u>Zie schema</u>		

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☐ I-/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: <u>10,3</u> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau: <u>1</u> MΩ	☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test diff.		
Differentieelstroominrichting: ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☒ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<u>Nihil</u>
Inbreuken Bestaande installatie	<u>Nihil</u>
Opmerkingen	<u>Nihil</u>
	Visum DNB of aangestelde:

Besluit(en):

- ☒ De nieuwe installatie voldoet ☒ voldoet niet aan het AREI.
☐ De bestaande installatie voldoet ☒ voldoet niet aan het AREI.

Agent bezeker:

Naam: Van Thienen Mph Agent nr.: 4414 Datum: 22/07/2019
Bijlage(n): ☒ Situatieschema(s): 2 ☒ Eéndraadsschema(s): 1


De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

☐ door hetzelfde erkend organisme (*).

Voor de directeur generaal: Handtekening

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
- De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

0.0712572
VINCOLTE VZW
Sijde van Thuis
SLA

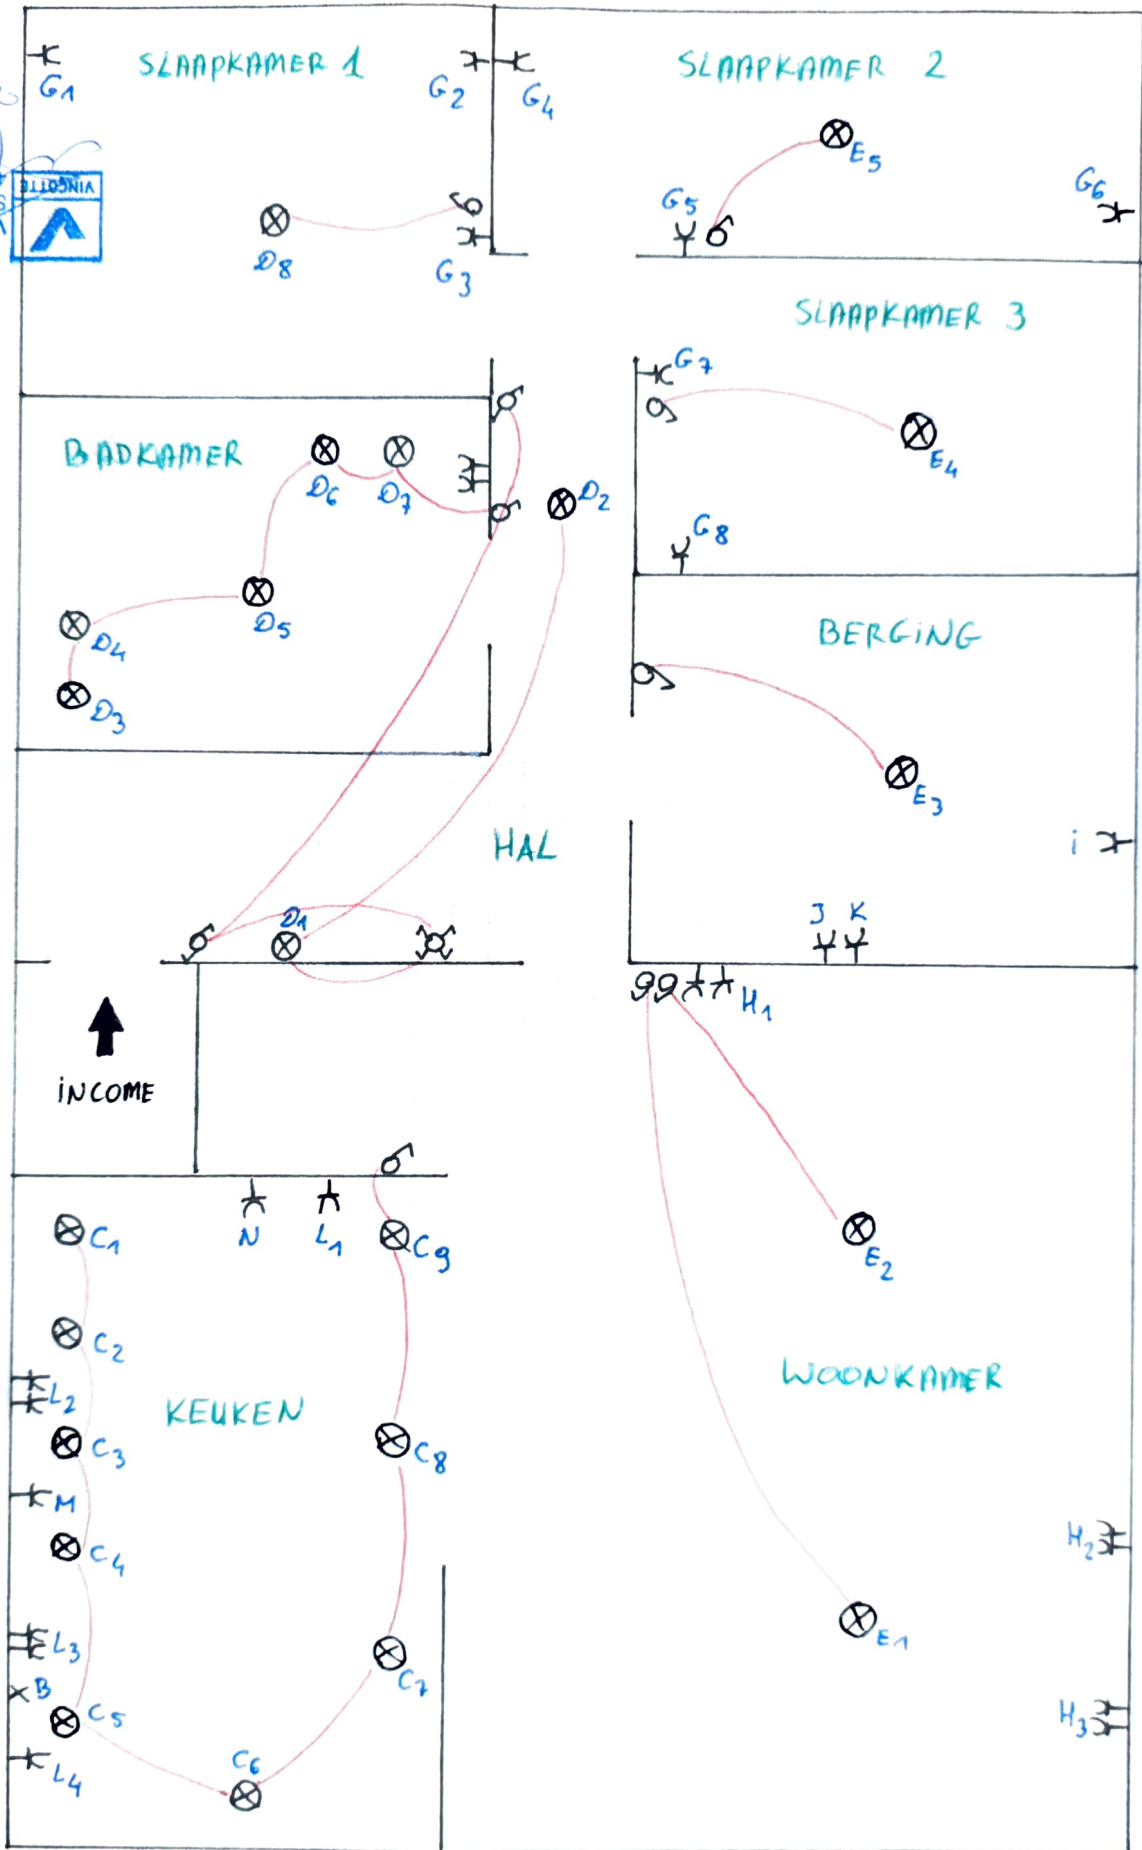

Kwh

KELDER

300
mA

30
mA

C32	B	3G6	
C16	C	3G1,5	9 x Ø
C16	D	3G1,5	8 x Ø
C16	E	3G1,5	5 x Ø
C20	F	3G2,5	1 x 4
C20	G	3G2,5	8 x 4
C20	H	3G2,5	3 x 4
C20	i	3G2,5	1 x 4
C20	J	3G2,5	1 x 4
C20	K	3G2,5	1 x 4
C20	L	3G2,5	2 x 4 2 x 4
C20	M	3G2,5	1 x 4
C20	N	3G2,5	1 x 4



VINCOTTE vzw
Stefan Van Thielen
4415

27/6/19

A - DIFF. 63A 30 mA
B - C 32
C - C 16
D - C 16
E - C 16
F - C 20
G - C 20
H - C 20
I - C 20
J - C 20
K - C 20
L - C 20
M - C 20
N - C 20

KOOKPLAAT

LICHT KEUKEN

LICHT HAL + BADKAMER + SLAAPKAMER 1

LICHT WOONKAM. + BERGING + SLAAPKAM. 2+3

STOPCONTACT BADKAMER

STOPCONTACT SLAAPKAMER 1+2+3

STOPCONTACT WOONKAMER

STOPCONTACT KETEL (BERGING)

STOPCONTACT DROOGMACHINE (BERGING)

STOPCONTACT WASTMACHINE (BERGING)

STOPCON. KEUKEN + DAMPKAP + KOELKAST

STOPCONTACT VAATWASSER (KEUKEN)

STOPCONTACT MICROGOLF (KEUKEN)



VINCOTTE VZW
Staten Van Thienen
4415

22/5/2019
