



Verslag

VERSLAG NR

GEN/15/61061011/00/NL/000



040 - INSP

Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1 - KB 8/09/2019) - Algemene Directie Energie

Sint-Gabriëlstraat 4 - 2530 Boechout



Uitgevoerd op: 07/02/2022



Uitgevoerd door: GEERT SLANGEN (2019)

Conform

IDENTIFICATIE VAN DERDEN

Opdrachtgever van de controle

Naam, Voornaam SANI-RENO BVBA
Adres Bloemenhof 3 - 2500 Lier

Eigenaar, uitbater of beheerder

Naam, Voornaam SANI-RENO BVBA
Adres Bloemenhof 3 - 2500 Lier

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk

Naam, Voornaam SANI-RENO BVBA
Adres Bloemenhof 3 - 2500 Lier

IDENTIFICATIE VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Vinçotte ID 100 061 613
Adres Sint-Gabriëlstraat 4 - 2530 Boechout
EAN-code EAN code Niet gecommuniceerd
Netbeheerder naam Fluvius
Nr Teller 1100050294
Teller index dag 868
Teller index nacht 1052
Type installatie HUISHOUDELIJKE Inst.
Andere gegevens [REDACTED] Sint Gabrielstraat 4 2530 Boechout

VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)
Maatschappelijke zetel : Jan Ollieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 9 244 77 91 buildingnorth@vincotte.be
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

Uitgiftedatum: 09/02/2022

1 / 11

GEGEVENS VAN DE CONTROLE

De controle wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie (B.S. van 28/10/2019), in dit document "Boek 1" genoemd.

Type controle	- Conformiteitscontrole voor gebruik - Belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4)
Datum van de uitvoering van de installatie	- Vanaf 01/06/2020
Informatie inhoud controle	- Alleen de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie werden gecontroleerd.
Afwijkingen	- Geen

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Spanning (V)	230
Aard van de stroom	Eenfasig
Type van aardelektrode	Aardinspen(nen)
Voedingsleiding - Type	VVB
Voedingsleiding - Doorsnede	10
Aantal eindstroombanen	18
Type van het aardverbindingssysteem	TT
Aantal elektrische borden	1
Nominale waarde van de bescherming van de aansluiting (A)	63
Geplaatste (alg.) differentieelstroominrichtingen	1

Differentieel	In(A)	Gevoeligheid (mA)	Type
A'	63	300	A


Beschrijving van de elektrische installatie

Hoofdvorm woning

Plaats Kelder

Aantal elektrische borden 1

Aantal stroombanen 18

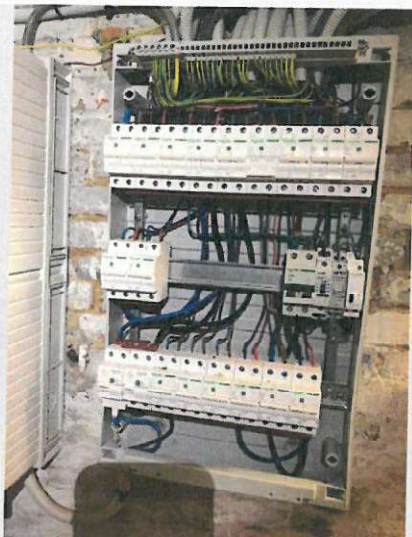

(Inwendige foto)



(Uitwendige foto)

Aardverbinding

Andere gegevens

Eensgezind woning

SCHEMA'S EN PLANNEN VAN DE INSTALLATIE

Situatieplan - referentie	Situatie schema's woning
Situatieplan - versie	A
Situatieplan - datum	07/02/2022
Situatieplan	Zie bijlagen
Eendraadsschema - referentie	eendraadsschema woning
Eendraadsschema - versie	A
Eendraadsschema - datum	07/02/2022
Eendraadsschema	Zie bijlagen

RESULTATEN VAN DE CONTROLE

Uitgevoerde controles

Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de eendraadsschema's en de situatieplannen	Ok
Staat van het vast geïnstalleerd elektrische materieel	Ok
Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking	Ok
Visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen	Ok
Visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen	P.A.

Metingen en beproevingen

Spreidingsweerstand van de aardverbinding (Ω)	18
Waarde van het algemeen isolatieniveau ($M\Omega$)	77
Test werking van de differentieelstroominrichtingen (testknop)	Ok
Test werking van de differentieelstroominrichtingen (foutlus)	Ok
Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders	Ok

Vastgestelde inbreuken

- Nihil

Opmerkingen

Badkamer 1 & 2

- Liaison équipotentielle supplémentaire non visible / non accessible ; Liaison équipotentielle supplémentaire non visible / non accessible

BESLUIT VAN DE CONTROLE


De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 (KB van 8/09/2019) inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Er dient gevolg gegeven te worden aan de opmerkingen/aanbevelingen die in dit verslag geformuleerd zijn.

Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór 7/2/2047.

De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.

De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werd verzegeld.


Ing. J. Windey
Directeur-generaal Vincotte

VERWIJZING NAAR DE REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

De Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft moet onmiddellijk in kennis worden gesteld van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.

Bijlagen

Foto situatieplan (1/4)

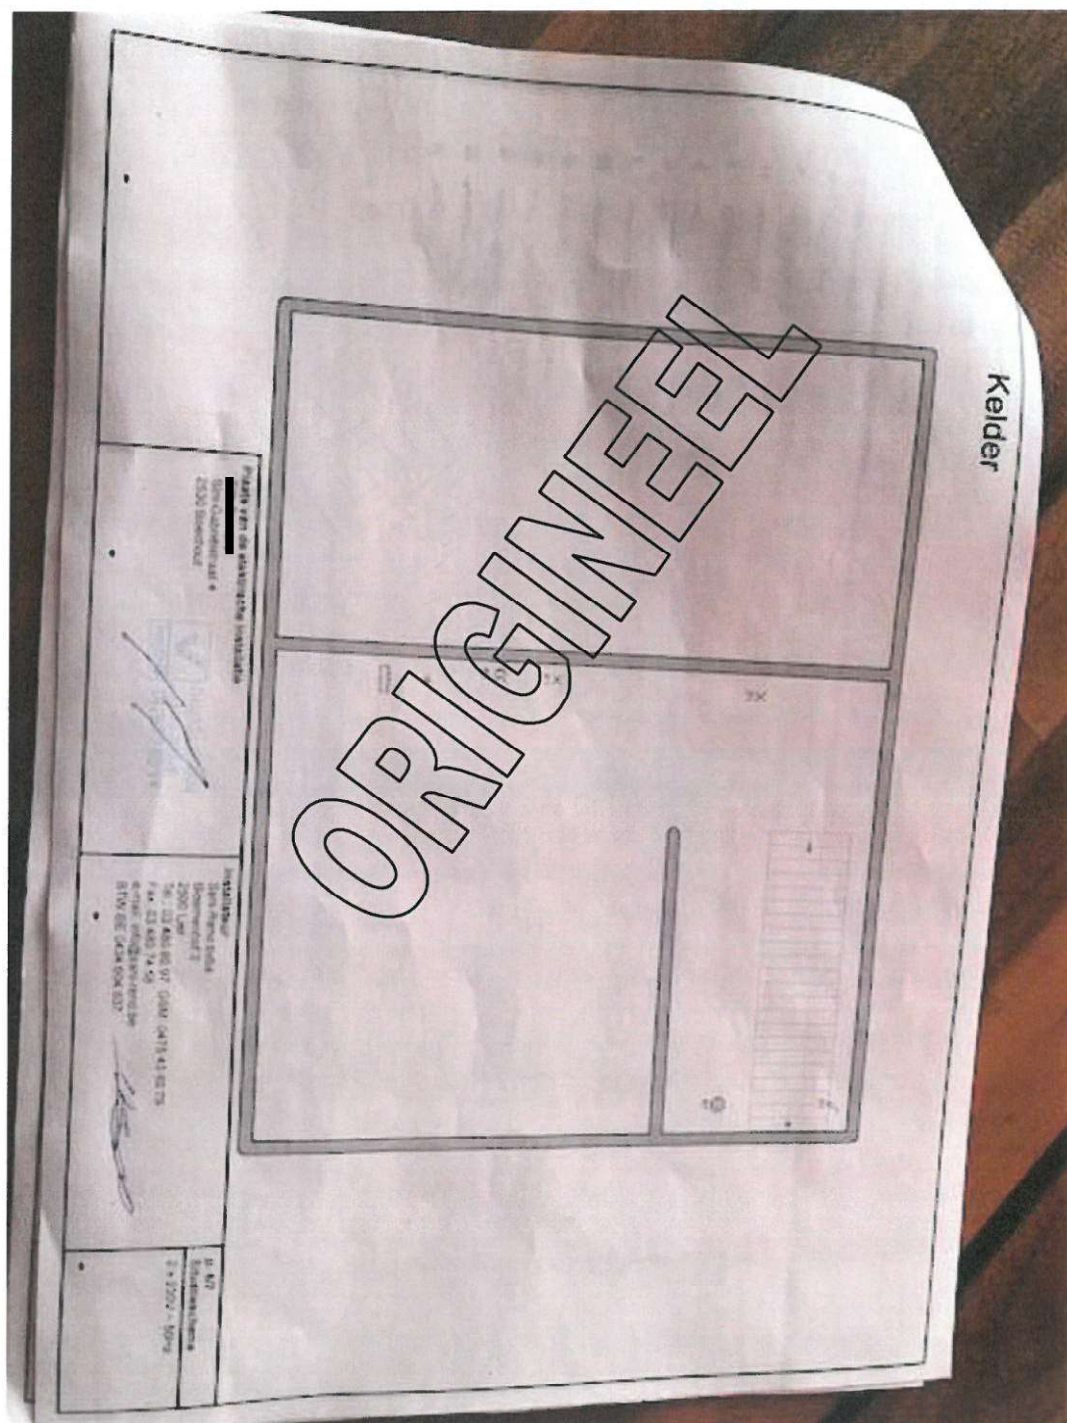


Foto situatieplan (2 / 4)

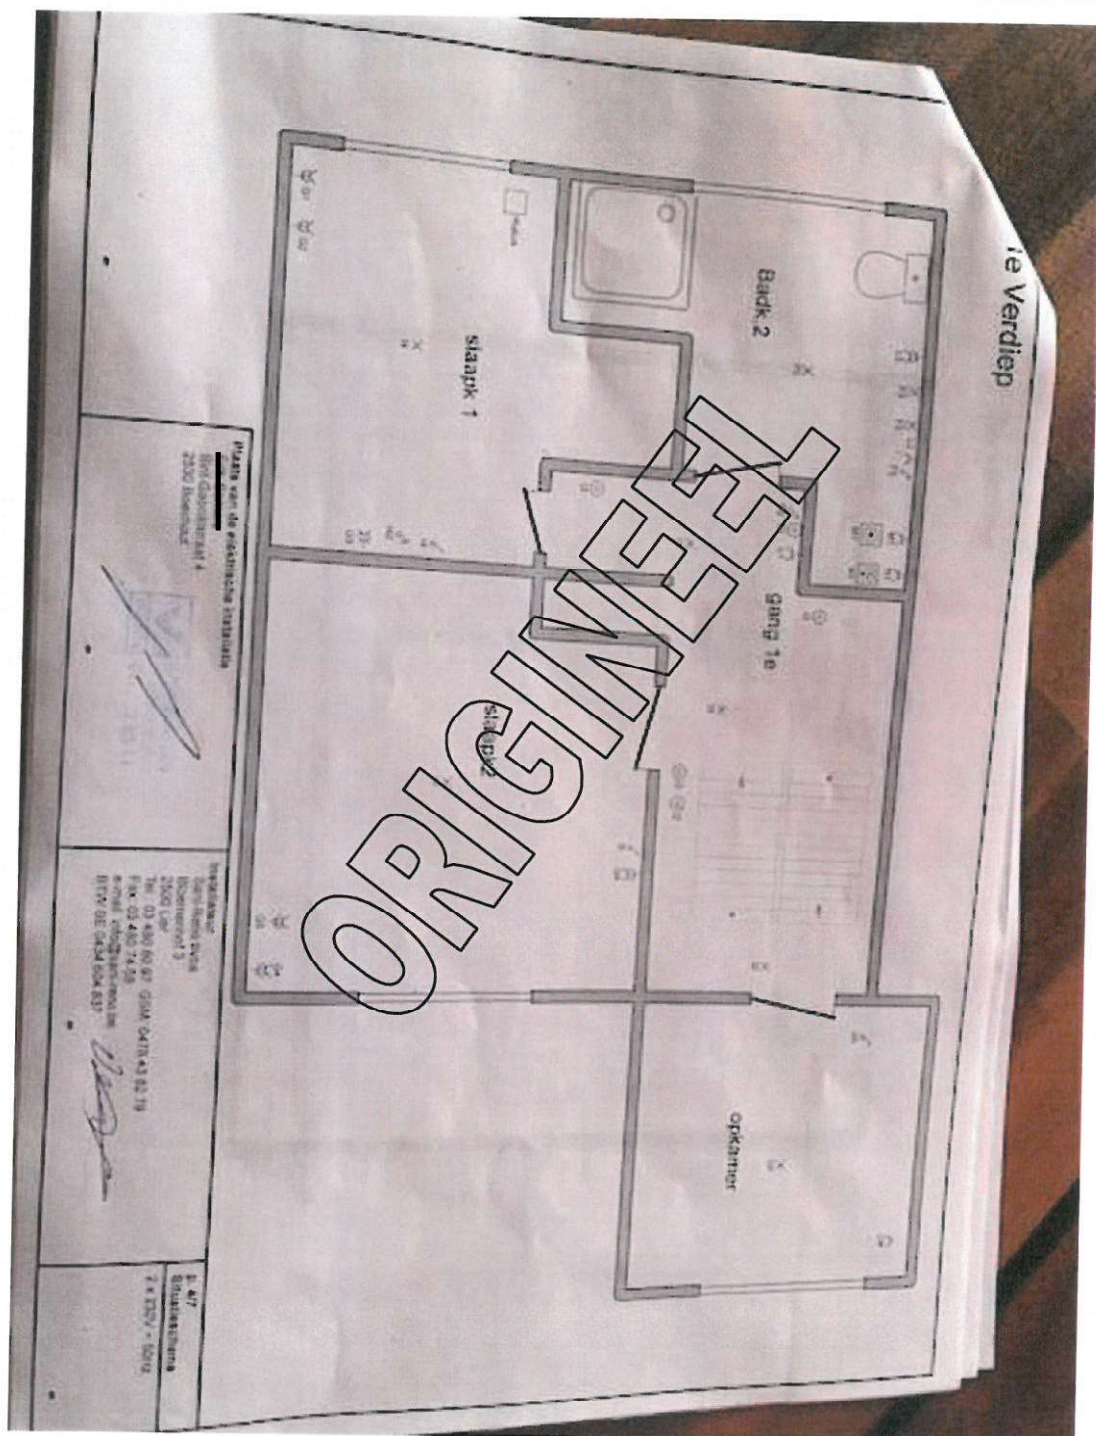




Foto situatieplan (4 / 4)

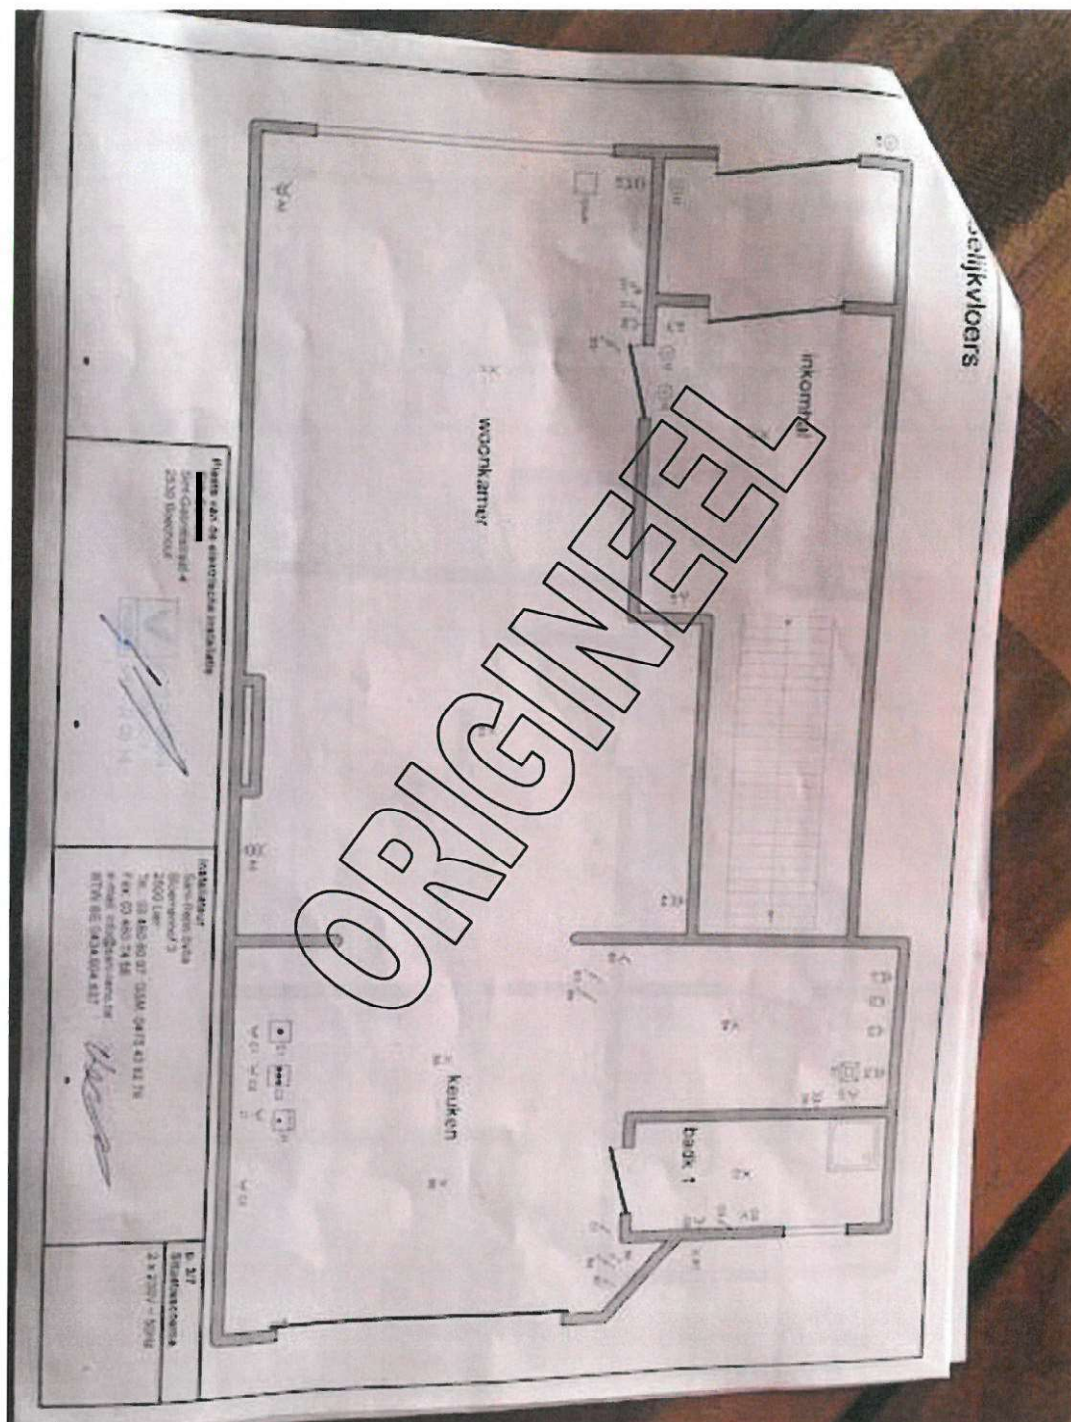


Foto van de eendraadschema's (1/2)

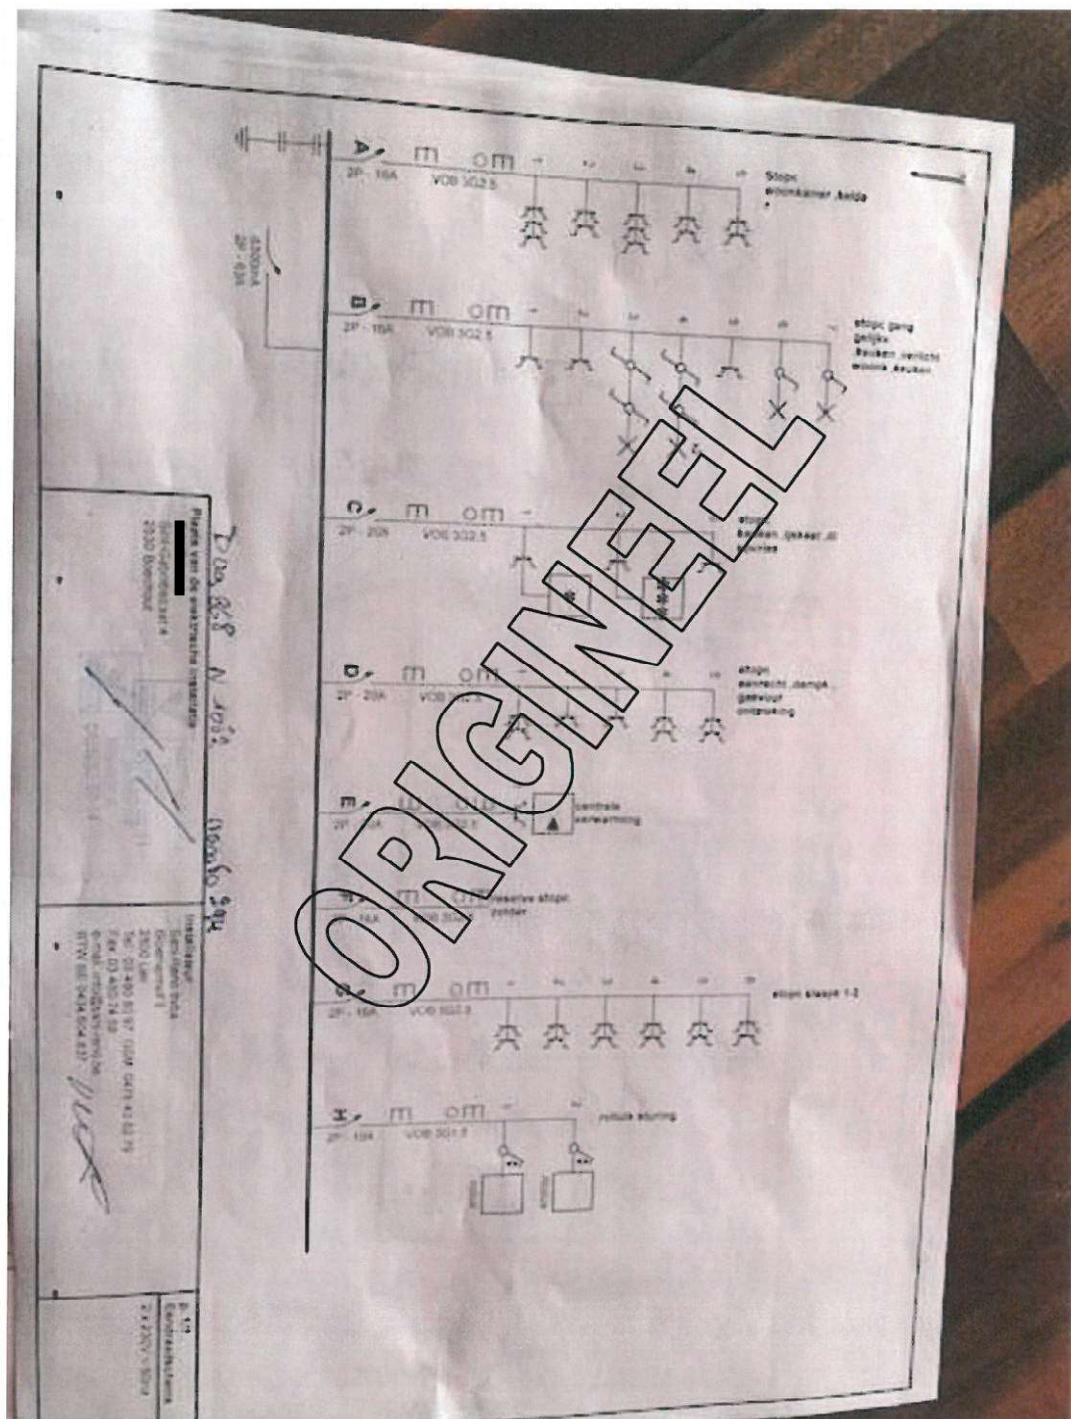


Foto van de eendraadschema's (2 / 2)

